

## SE構法・施工品質管理表

(構造検査報告書用)

SE構法の施工における構造検査報告は以下の品質管理表によっておこなってください。

### (1) SE構法・施工品質管理表リスト

| No. | 管理表名称検査       | 提出      | チェック | 指示確認事項            | 確認 |
|-----|---------------|---------|------|-------------------|----|
| 1   | 建築確認済証の写し     | 要       |      | 住所・面積の確認用<br>1部提出 |    |
| 2   | SE構法構造検査報告書－Ⅰ | 要       |      | 1部提出              |    |
| 3   | 施工写真シート・Ⅰ－①   | 要       |      | 1部提出              |    |
| 4   | 施工写真シート・Ⅰ－②   | 要       |      | 1部提出              |    |
| 5   | 施工写真シート・Ⅰ－③   | 要       |      | 1部提出              |    |
| 6   | 施工写真シート・Ⅰ－④   | 要       |      | 1部提出              |    |
| 7   | 施工写真シート・Ⅰ－⑤   | 要       |      | 1部提出              |    |
| 8   | 施工写真シート・Ⅰ－⑥   | 要       |      | 1部提出              |    |
| 9   | SE構法構造検査報告書－Ⅱ | 要<br>※1 |      | 1部提出              |    |
| 10  | 施工写真シート・Ⅱ－①   | 要<br>※1 |      | 1部提出              |    |

※1：SE—DSパネルを使用した場合のみ

記入の方法（詳細はSE構法性能報告書サンプルを参照してください。）

- 工事名、検査日、登録施工店名等の項目はしっかりと記入して下さい。
- 施工写真は必ず日付、邸名、検査箇所を記入した黒板等を入れて確認しやすい写真として下さい。
- 該当事項の確認は全箇所おこなって下さい。
- 該当事項の有無の欄に、○で囲って下さい。
- 該当事項のチェック欄に、レ点でチェックして下さい。
- 該当事項の可否の欄に、○で囲って下さい。不合格・未処理の場合には、速やかに処置をして検査したうえ再度可否の欄に、○で囲って下さい。
- SE構法施工管理技士の検印を必ずして下さい。

提出期限等

- すべての構造検査完了後、14日以内に(株)NCN品質管理課へ提出して下さい。
- 各提出書類は[正、1部]を提出して下さい。
- (株)NCN確認の上、合格の場合は性能報告書として作成し[正、1部]を返却いたします。  
(その際、(株)NCNで複製をデータ保存させていただきます)
- 不合格、不備の場合あるいは提出期限内に提出されない場合は性能報告書を発行できない場合があります。

※各様式は、SE構法のホームページ（登録施工店専用ページ）からダウンロードしてご使用下さい。

### (2) SE構法構造検査報告書記入方法

- 検査は必ずSE構法施工管理技士が直接行うこと。
- 検査項目別に検査し、チェック・可否及び日付を記入する。
- 該当しない項目は斜線を記入する。

### (3) 記録写真

○ 必ず日付・邸名・撮影ヶ所を記入した黒板等を入れた写真であること。

| 施工写真シート | 記録個所                 | 枚数、他                                                                                                         | 備考（その他写真貼付け欄に記載）                   |
|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| I-①     | 躯体全景                 | 1枚                                                                                                           | 上棟後または耐力壁施工直後の全景とする。               |
|         | 基礎配筋の全景              | 1枚                                                                                                           | ※自社による基礎計算の場合でも添付すること。（全体が確認できること） |
| I-②     | アンカーボルト<br>（柱脚用・土台用） | 1枚                                                                                                           | ※自社による基礎計算の場合でも添付すること。（仕様が確認できること） |
|         | SE 構法に使用した釘          | 1枚                                                                                                           | 指定釘の種類がわかること。                      |
| I-③     | 柱脚部の緊結               | 主だった柱脚部：1枚                                                                                                   | アンカーボルトの緊結状況（ハイブリットナット締付）を確認できること。 |
|         | 垂木の固定状況              | 1枚                                                                                                           | 垂木の固定状況が確認できること。                   |
| I-④     | 床合板敷込み（一般部）          | 1枚                                                                                                           | 2・3 階の床敷込み状況が確認できること。              |
|         | 床合板敷込み（補強部）          | 1枚                                                                                                           |                                    |
| I-⑤     | 一般耐力壁の全景             | GT1 (W) /GT2 (W) /GP1 (W) /GP2 (W)<br>GB6 (W) /GB7 (W) /MP1 (W) /MP2 (W)<br>DP1 (W) /DP2 (W)<br>いずれか 1 種類：1枚 | 一般・高耐力壁別に添付する。                     |
|         | 高耐力壁の全景              | GT3 (W) /GT4 (W) /GP3 (W) /GP4 (W)<br>GB8 (W) /GB9 (W) /MP3 (W)<br>DP3 (W) /DP4 (W)<br>いずれか 1 種類：1枚          |                                    |
| I-⑥     | 耐力壁の下地枠              | 1枚                                                                                                           | 合板下地枠組みが確認できること。                   |
|         | 予備                   |                                                                                                              |                                    |
| II      | SE-DS パネルの全景         | 1枚                                                                                                           | SE-DS パネルを使用した場合のみ。                |
| II-①    | SE-DS パネルの気密         | 気密シールの施工：1枚                                                                                                  | 指定の仕様、施工であること。                     |
|         | SE-DS パネルの釘          | 使用した釘：1枚                                                                                                     |                                    |

SE構法  
構造検査報告書-I

作成日 2025年11月25日

|         |            |                 |             |      |
|---------|------------|-----------------|-------------|------|
| 物件No.   | ABC333※1   | 工事名             | 耐震 太郎       | 新築工事 |
| 上 棟 日   | 2025年11月7日 |                 |             |      |
| 登録店 No. | 8888※2     | 登録 施工店名         | (株)エヌ・シー・エヌ |      |
| 管理技士No. | 9999※3     | SE構法<br>施工管理技士名 | 構造 強        |      |

○ 建物概要のチェック

|                    |   |                    |
|--------------------|---|--------------------|
| ■地盤調査              | 有 | 備考：（地盤改良・基礎補強等の内訳） |
| ■地耐力の確認            | 有 | 基礎補強工事             |
| ■地盤改良工事            | 無 | PCパイプφ200による杭打ち補強  |
| ■基礎補強工事（杭打ち、基礎拡張等） | 有 | L=5M×25本           |

○ SE金物・床合板のチェック

| 項目<br><br>階 |  | 柱脚金物の設置       |                 | 土台<br>アンカーボルト<br>締付 | S E 金物<br>の取付 | ドリフトピン<br>打込 | 床合板 t=24、28、30 |             | 検 査 日 （月/日） |     |     |     |
|-------------|--|---------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|
|             |  | 通り、レベル<br>の確認 | ハイフリットナット<br>締付 |                     |               |              | 敷込<br>(千鳥)     | 釘ピッチ (CN75) |             | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
|             |  |               |                 |                     |               |              |                | @150        | @75         |     |     |     |
| 基礎・土台       |  | ✓             | ✓               | ✓                   | —             | —            | —              | —           | —           | 合   |     |     |
| 1 F         |  | —             | —               | —                   | ✓             | ✓            | —              | —           | —           |     | 合   |     |
| 2 F         |  | —             | —               | —                   | ✓             | ✓            | ✓              | ✓           | ✓           |     | 合   |     |
| 3 F         |  | —             | —               | —                   |               |              |                |             |             |     |     |     |
| 4 F         |  | —             | —               | —                   |               |              |                |             |             |     |     |     |
| 小屋／PH       |  | —             | —               | —                   | ✓             | ✓            |                |             |             |     | 合   |     |

○ 耐力壁のチェック

| 一般耐力壁                                                 |           |         |           | 高耐力壁    |           |         |           | 検 査 日（月/日） |     |     |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|------------|-----|-----|
| 外周 @150                                               |           | 外周 @100 |           | 外周 @75  |           | 外周 @50  |           | 第1回        | 第2回 | 第3回 |
| 中央 @150                                               |           |         |           |         |           |         |           | 11/23      |     |     |
| 構造用合板特類1級厚9mm（CN50）                                   |           |         |           |         |           |         |           | 合          |     |     |
| GT1                                                   | GT1W      | GT2     | GT2W      | GT3     | GT3W      | GT4     | GT4W      |            |     |     |
|                                                       |           | ✓       |           |         |           | ✓       | ✓         |            |     |     |
| 構造用合板特類2級厚12mm（CN65）                                  |           |         |           |         |           |         |           |            |     |     |
| GB1                                                   | GB1W      | GB2     | GB2W      | GB3     | GB3W      | GB4     | GB4W      |            |     |     |
|                                                       |           |         |           |         |           |         |           |            |     |     |
| モイス厚9.5mm（CN50）                                       |           |         |           |         |           |         |           |            |     |     |
| MP1                                                   | MP1W      | MP2     | MP2W      | MP3     | MP3W      |         |           |            |     |     |
|                                                       |           |         |           |         |           |         |           |            |     |     |
| ダイライト厚9mm（CN50）                                       |           |         |           |         |           |         |           | 合          |     |     |
| DP1                                                   | DP1W      | DP2     | DP2W      | DP3     | DP3W      | DP4     | DP4W      |            |     |     |
|                                                       |           |         |           |         |           | ✓       |           |            |     |     |
| 構造用合板特類2級厚12mm（CN50）・OSB3級厚12mm（CN50）／OSB4級厚9mm（CN50） |           |         |           |         |           |         |           |            |     |     |
| GP6／GP1                                               | GP6W／GP1W | GP7／GP2 | GP7W／GP2W | GP8／GP3 | GP8W／GP3W | GP9／GP4 | GP9W／GP4W |            |     |     |
|                                                       |           |         |           |         |           |         |           |            |     |     |


○ 屋根・垂木構面のチェック

| 項 目<br><br>構面仕様 | 垂 木  |           |      |                |      | 野地合板      |   |      | 検 査 日 （月/日）  |     |     |
|-----------------|------|-----------|------|----------------|------|-----------|---|------|--------------|-----|-----|
|                 | 垂木寸法 | 垂木<br>ピッチ | 固定方法 |                | 転び止め | 合板厚<br>確認 | 釘 | 釘ピッチ | 第1回<br>11/11 | 第2回 | 第3回 |
|                 |      |           | 釘    | ジョイント<br>スクリュー |      |           |   |      |              |     |     |
| 合板張り仕様          | —    | —         | —    | —              | —    |           |   |      |              |     |     |
| 登り梁仕様/斜め釘打ち仕様   | ✓    | ✓         | ✓    | —              | —    | ✓         | ✓ | ✓    | 合            |     |     |
| 転び止め仕様          |      |           |      | —              |      |           |   |      |              |     |     |
| ジョイントスクリュー仕様    |      |           | —    |                |      |           |   |      |              |     |     |

「母屋伏図」「床・屋根水平構面仕様」に記載されている仕様の欄にチェック

※4

# ※1 物件 No.

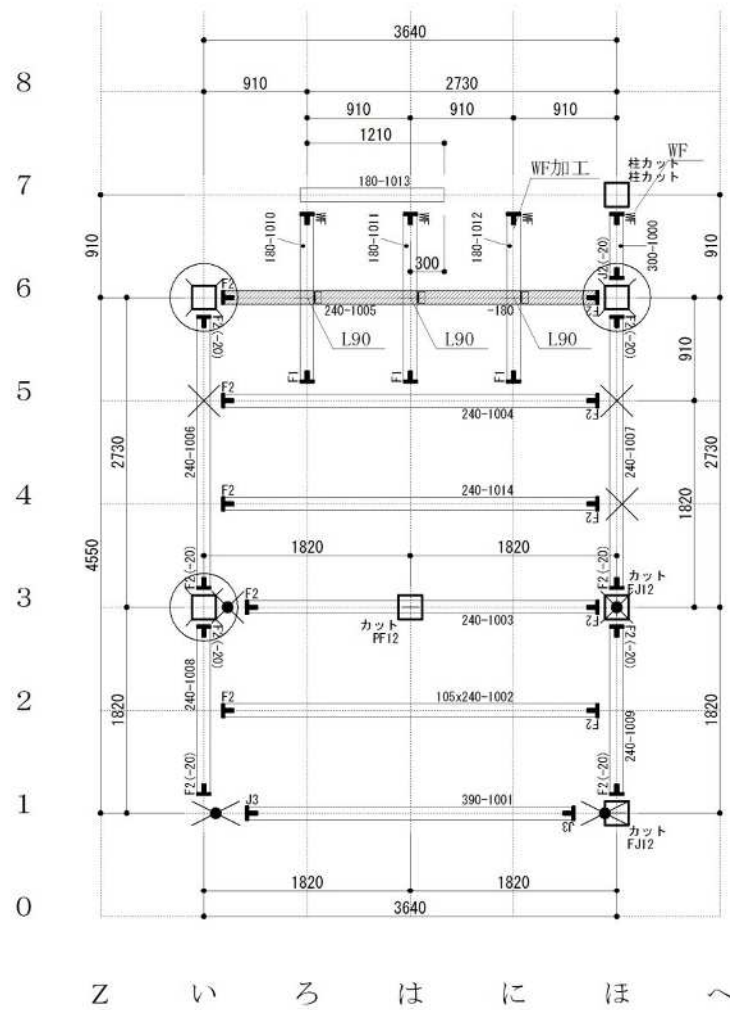

(株) エヌ・シー・エヌ 東京本社

東京都港区港南1-7-18

DBC品川東急ビル

TEL 03-6872-5601 FAX 03-6872-5611

ABC333

耐震太郎様邸新築工事／株式会社エヌ・シー・エヌ

2階床伏図

階高 1450 mm

縮尺 S=1:50

日付 2018年 3月30日 10:23

## ※2 登録店 No.



# 耐震構法 SE構法

## SE構法登録施工店認定証

株式会社 エヌ・シー・エヌ

登録番号 8888号



貴社は、株式会社エヌ・シー・エヌが開発・提供する  
SE構法を使用することを認められた  
SE構法登録施工店であることを、ここに証します。

平成30年12月14日

株式会社エヌ・シー・エヌ

代表取締役社長

田鎖 郁男



### ※3 管理技士 No.

技士番号 9 9 9 9  
氏 名 構造 強  
登録店名 株式会社エヌ・シー・エヌ  
有効期限 2030/03




- 本資格は、株式会社エヌ・シー・エヌが開催するSE構法技術研修会を受講し、SE構法施工管理技士試験に合格したものに与えられる資格である。
- SE構法施工管理技士は、SE構法による建築において、その建築物がSE構法品質管理基準で施工されるように指導・管理しなければならない。


## ※4 屋根・垂木構面のチェック

## 口母屋伏凶


※屋根構面：【垂木構造】登り梁仕様 詳細は別紙参照

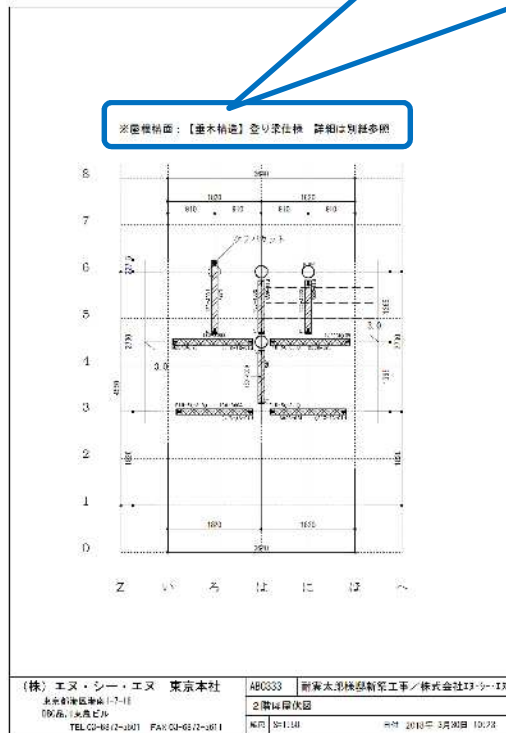

## □床・屋根水平構面仕様

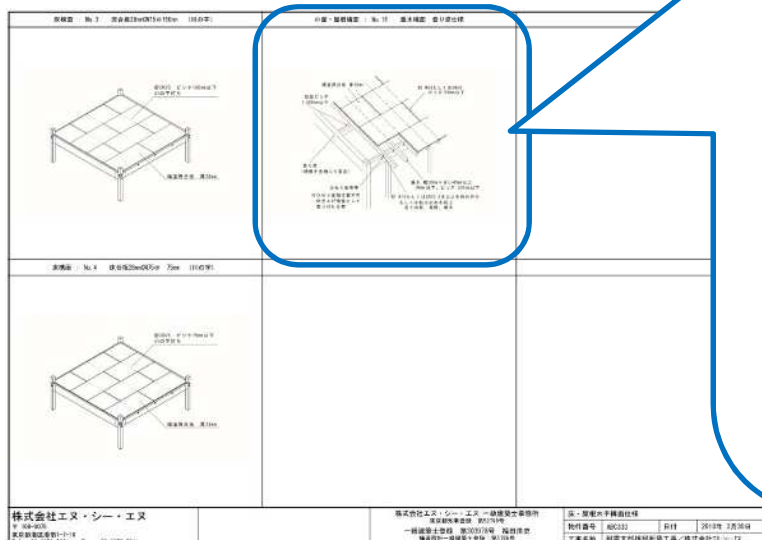

小屋・屋根構面 : No. 15 垂木構面 登り梁仕様

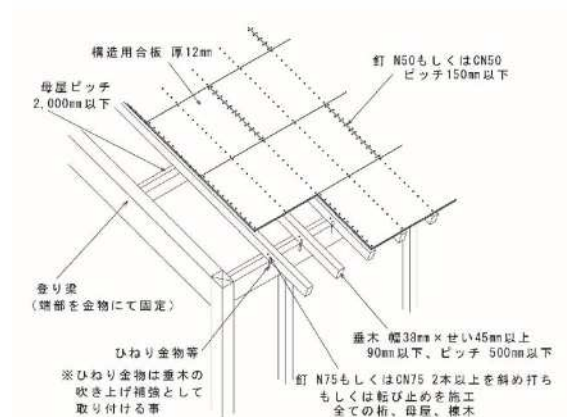

※ひねり金物同等品としてタルキックⅡ、Xポイントビスの使用は可能です。

**注 意** ※「ジョイントスクリュー仕様（旧タルキビス仕様）」は、NCN支給のジョイントスクリューで垂木を留める仕様です。

**注 意** ※タルキックⅡ、Xポイントビスによる垂木の固定は、「ジョイントスクリュ仕様」ではありません。

SE構法  
施工写真シート・I-①

工事名

耐震 太郎

新築工事

<躯体全景>

上棟工事完了が確認できる写真



撮影日

2025/11/25

撮影ヶ所

東面

躯体全景

撮影面の記入

<基礎配筋の全景>

配筋工事完了が確認できる写真



撮影日

2025/10/7

撮影ヶ所

西面

基礎配筋全景

撮影面の記入

SE構法  
施工写真シート・I-②

## 新築工事

＜アンカーボルト＞ 柱脚用M20 ／ 土台用M12

## 柱脚用・土台用アンカーボルトが確認できる写真

撮影日

2025/9/26



### 柱脚用アンカーボルト

M20 L=580

## 土台用アンカーボルト

M12 L=400

## 径・長さの記入

＜SE構法に使用した釘＞ C N50（緑色）・C N65（黄色）・C N75（青色）・C N90（赤色）等

## 使用釘が確認できる写真

## 摄影日

2025/11/8



### 使用釘

CN90 枰材・受け材

CN75 枰材・床合板

CN50 耐力壁

## 撮影面の記入

SE構法  
施工写真シート・I-③

工事名 耐震 太郎 新築工事

＜柱脚部の緊結＞

ハイブリッドナットの締付が確認できる写真



|             |           |
|-------------|-----------|
| 撮影日         | 2025/11/5 |
| 撮影ヶ所        | い 通り 1 通り |
| ハイブリッドナット締付 |           |
|             |           |
|             |           |
|             |           |
|             |           |
|             |           |
|             |           |
|             |           |

撮影箇所の記入

＜垂木の固定状況＞

垂木の固定状況・垂木ピッチが確認できる写真



|              |           |
|--------------|-----------|
| 撮影日          | 2025/11/8 |
| 撮影ヶ所         |           |
|              |           |
|              |           |
| 垂木 45×60     |           |
| 垂木ピッチ @455   |           |
| 垂木固定釘 CN75-2 |           |
|              |           |
|              |           |
|              |           |
|              |           |

垂木寸法・ピッチ・固定釘の記入

SE構法  
施工写真シート・I-④

工事名

耐震 太郎

新築工事

<床合板の敷き込み> 一般部@150

合板の敷込み状況・釘ピッチ@150が確認できる写真  
※2階以上の床を撮影



|             |           |
|-------------|-----------|
| 撮影日         | 2025/11/8 |
| 撮影ヶ所        | 2 階       |
| い〜ろ 通り      | 8 通り      |
| 28mm合板 千鳥貼り |           |
| 固定釘 CN75    |           |
| 釘ピッチ @150   |           |
|             |           |
|             |           |
|             |           |

固定釘・釘ピッチの記入

<床合板の敷き込み> 補強部@75

合板の敷込み状況・釘ピッチ@75が確認できる写真  
※2階以上の床を撮影



|             |           |
|-------------|-----------|
| 撮影日         | 2025/11/8 |
| 撮影ヶ所        | 2 階       |
| ろ 通り        | 7~8 通り    |
| 28mm合板 千鳥貼り |           |
| 固定釘 CN75    |           |
| 釘ピッチ @75    |           |
|             |           |
|             |           |
|             |           |

固定釘・釘ピッチの記入

# SE構法 施工写真シート・I-⑤

工事名

耐震 太郎

新築工事

<一般耐力壁の全景> 外周釘@150 / 外周釘@100

外周釘ピッチ @150、@100 が確認できる写真



撮影日

2025/11/22

撮影ヶ所

1 階

る～を 通り 1 通り

一般耐力壁 GT2

固定釘 CN50

釘ピッチ


外周 @100

中央 @150

耐力壁の種類・固定釘・釘ピッチ(外周、中央)の記

<高耐力壁の全景> 外周釘@75 / 外周釘@50

外周釘ピッチ @75、@50 が確認できる写真

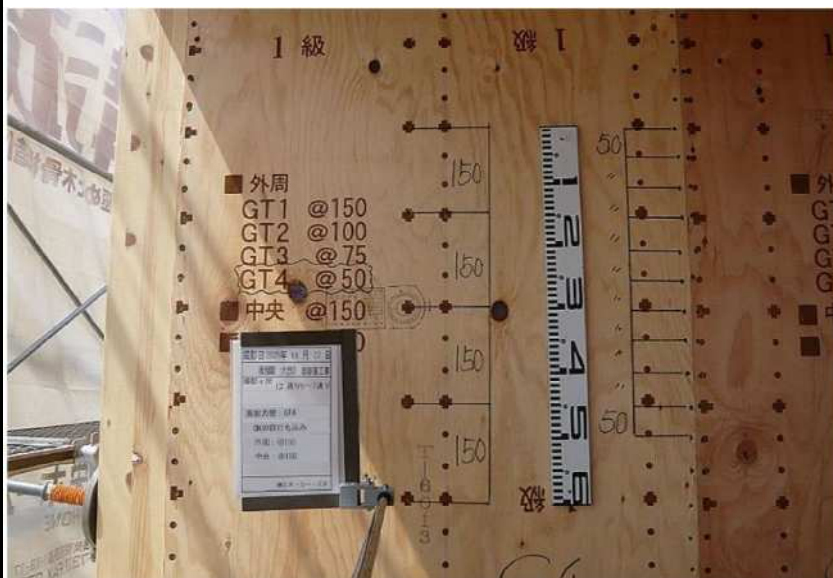

撮影日

2025/11/22

撮影ヶ所

2 階

は 通り 6～7 通り

高耐力壁 GT4

固定釘 CN50

釘ピッチ

外周 @50

中央 @150

耐力壁の種類・固定釘・釘ピッチ(外周、中央)の記

SE構法  
施工写真シート・I-⑥

新築工事

### ＜耐力壁の下地枠＞

耐力壁の下地枠(間柱)の固定状況(釘ピッチ、枠材寸法等)が確認できる写真

摄影日

2025/11/20

撮影ヶ所

## 2 階

と 通り 5~7 通り

高耐力壁 GT3W

間柱 30×90以上

固定釘 CN75

釘ピッチ

縦枅材 @150 千鳥打ち

横枅材 @100 千鳥打ち

繼目間柱 45×90以上



## 耐力壁の種類・枠材寸法・固定釘・釘ピッチの記入

< >

撮影日

撮影ヶ所

写真貼付欄

# S E 構 法 構造検査報告書-Ⅱ



工事名

耐震 太郎

新築工事

## ○ SE-DSパネルのチェック

| ヶ所   | 項目 | ジョイント部の釘<br>CN65の打ち付け<br>(両面)<br>(図1) | 気密シール剤の施<br>工確認<br>(図1) | 専用ビスの取り付<br>け確認<br>(図2) | スペーサー材の施<br>工確認<br>(図2) | 検 査 日 (月/日) |     |     |
|------|----|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----|-----|
|      |    |                                       |                         |                         |                         | 第1回         | 第2回 | 第3回 |
|      |    |                                       |                         |                         |                         | 11/8        |     |     |
| 屋根 1 |    | ✓                                     | ✓                       | ✓                       | ✓                       | 合           |     |     |
| 屋根 2 |    |                                       |                         |                         |                         |             |     |     |
|      |    |                                       |                         |                         |                         |             |     |     |

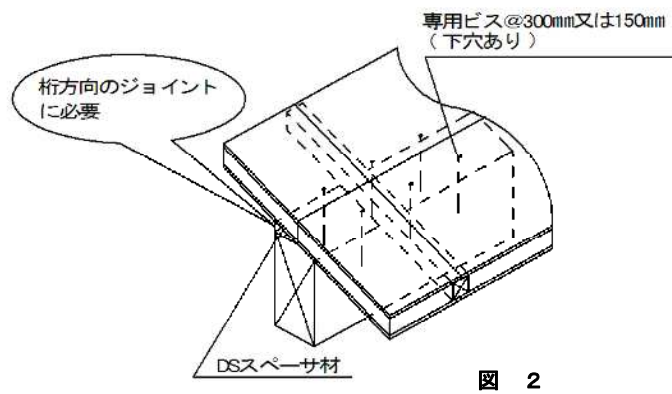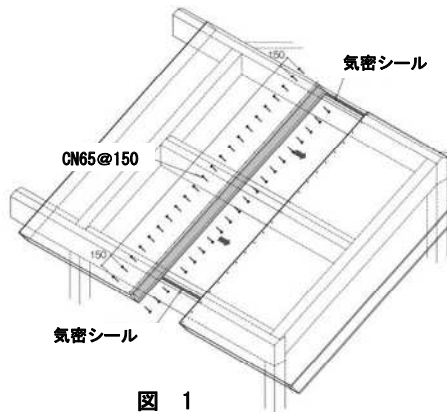

## <SE-DSパネルの全景>

### SE-DSパネルの設置状況が確認できる写真



撮影日

2025/11/8

撮影ヶ所

南面

SE-DSパネル全景

撮影面の記入

SE構法  
施工写真シート・Ⅱ-①

工事名 耐震 太郎 新築工事

<SE-DSパネル気密シール材の施工>

気密シールの施工状況が確認できる写真



|          |           |
|----------|-----------|
| 撮影日      | 2025/11/8 |
| 撮影ヶ所     |           |
|          | 7 通り      |
| 気密シールの施工 |           |
|          |           |
|          |           |
|          |           |
|          |           |
|          |           |

撮影箇所の記入

<SE-DSパネルジョイント部分釘の施工>

固定釘、釘ピッチが確認できる写真



|             |           |
|-------------|-----------|
| 撮影日         | 2025/11/8 |
| 撮影ヶ所        |           |
|             |           |
|             |           |
|             |           |
| 固定釘 CN65    |           |
| 釘ピッチ @150両面 |           |
|             |           |
|             |           |
|             |           |
|             |           |

固定釘・釘ピッチの記入

# まとめ

1. 耐力壁施工完了確認後 **1 4 日以内**に提出してください。

提出先：東京本社 [t-hinshitsu@ncn-se.co.jp](mailto:t-hinshitsu@ncn-se.co.jp)

大阪支店 [o-hinshitsu@ncn-se.co.jp](mailto:o-hinshitsu@ncn-se.co.jp)

2. 提出書類の確認をしてください。

- ・ 構造検査報告書 I
- ・ 施工写真シート I ①～⑥
- ・ 構造検査報告書 II ※DS パネル採用時のみ提出
- ・ 施工写真シート II ① ※DS パネル採用時のみ提出
- ・ **確認済証の写し** ※パスワード「**5 6 0 1**」を設定

3. 検査項目に**記入漏れ**がないようにしてください。

4. 施工写真は、施工工程が確認できる**鮮明な写真**を添付してください。

5. 構造部分（基礎、構造躯体）は、仕上げ工事により隠れてしまうので数多く撮影し記録してください。

6. 報告書は、受け取る側（**施主**）の**立場**になって作成してください。
